

ฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร



ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 6 บ้านตานน้อย ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
พิกัดโดยประมาณ 47 QPT 354049 ระวัง 5041-I

ลักษณะโครงการ

1. ฝายขนาดความสูง 3.00 ม. ความยาว 40.00 ม. จำนวน 2 ชุด
โดยก่อสร้างใน Cut off (ระดับสันฝาย ค.ส.ล. + 27.00 ม. รทก.
และ ระดับสันฝายสูงสุด + 30.00 ม. รทก.)
2. บานระบายขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 ชุด

พื้นที่รับประโยชน์


1. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการ และการอุปโภค
บริโภค
2. ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ โดยยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ และลดการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง

งบประมาณ

ค่าก่อสร้างโครงการ 350 ล้านบาท



ฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร

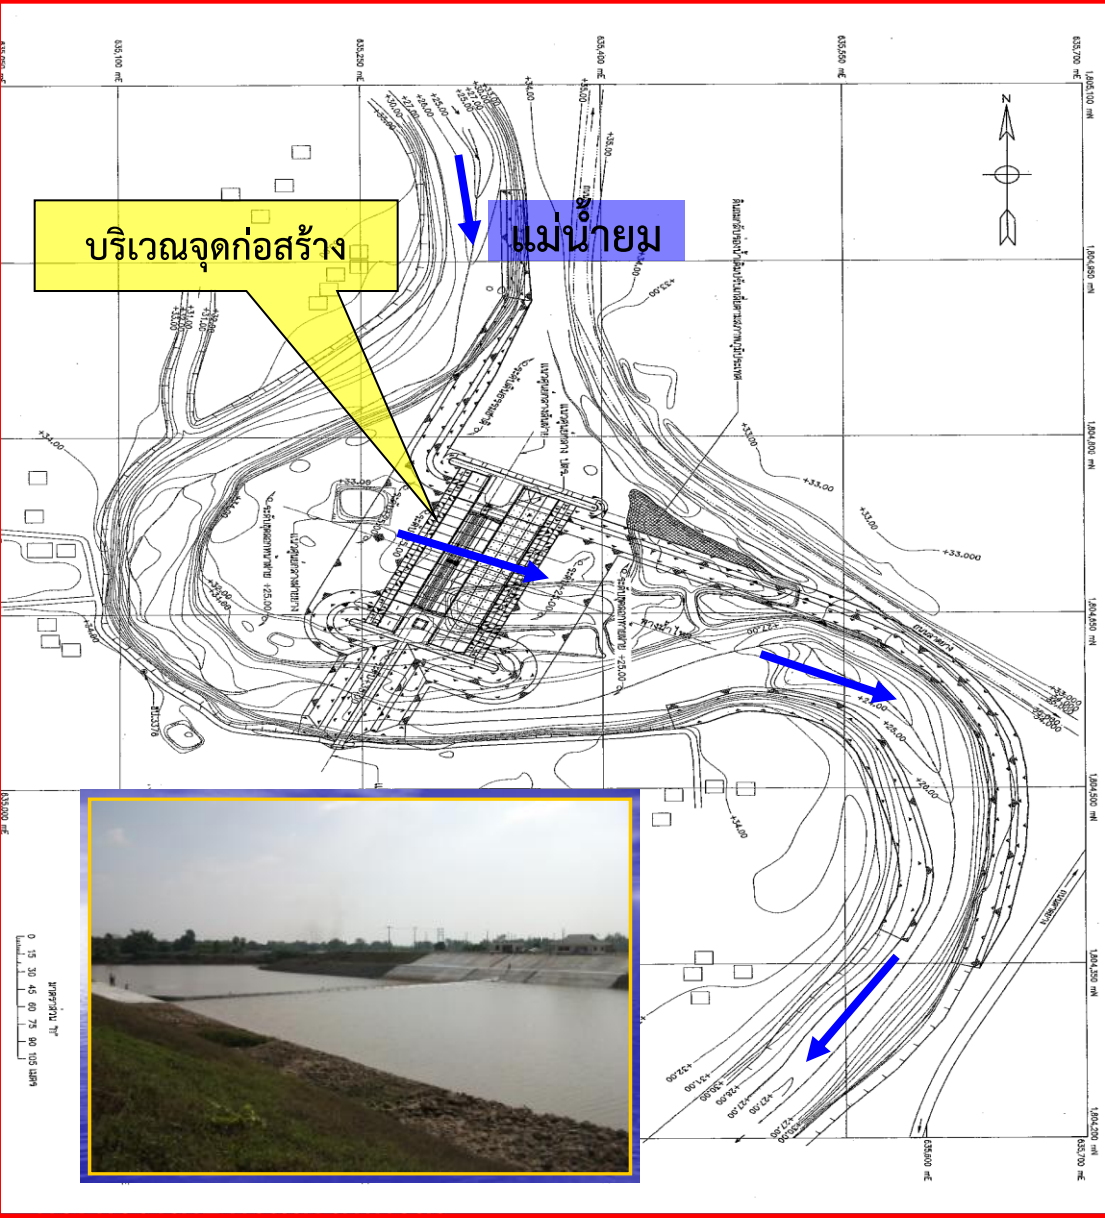

- ### แผนการดำเนินการ
- ฝายยาว ความสูง 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร จำนวน 2 ชุด
ระดับสันฝาย คสล. + 27.00 ม. รทก และระดับสันฝายสูงสุด + 30.00 ม. รทก
 - บานระบาย ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
ค่างานจ้างเหมาฯ	340,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2558	= 72,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2559	= 123,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2560	= 155,000,000 บาท
ค่าควบคุมงาน	10,000,000 บาท





การเตรียมความพร้อมก่อนก่อสร้างโครงการ

รายการ	ผลดำเนินการ
1. รายงานเบื้องต้น	ดำเนินการโดย สขป.3 แล้วเสร็จปี 2553
2. ผลการสำรวจภูมิประเทศ	ดำเนินการโดย สขป.3 แล้วเสร็จปี 2554
3. ผลการสำรวจปฐพีกลศาสตร์	ดำเนินการโดย สขป.3 แล้วเสร็จปี 2556
4. ออกแบบ	โดย (บริษัท วัฒนาสุข)
5. รายงานวางโครงการ (PR)	ดำเนินการโดยสำนักบริหารโครงการในปี 2557
6. ขอเปิดโครงการชลประทานขนาดกลาง	ดำเนินการในปี 2557
7. ประกาศกรมฯ , แผนสำรวจปักหลักเขต และรังวัดที่ดิน	ดำเนินการในปี 2557
8. อยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ จำเป็นต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	(เข้าแผนศึกษาปี 2557 งบประมาณ 15 ล้านบาท)
9. การขออนุญาตใช้พื้นที่ (ประมาณ 30 ไร่)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 22 ไร่ และที่ดินที่ยังไม่ทราบผู้ครอบครอง จำนวน 8 ไร่)
10. เวทีประชาคมเพื่อการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ซึ่งในเบื้องต้นเห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการ)

